

Nouvelles écoles secondaires

publique

Mille-Îles

et

catholique

Marie-Rivier

1381 avenue Demers



École secondaire publique
Mille-Îles



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario



Écoles
catholiques
Centre-Est

Mot de bienvenue et contenu

- Mot de bienvenue de la surintendance
- Présentation des participantes, participants et invités spéciaux
- Mise en contexte et objectif de la rencontre
- Mise à jour de la construction
- Photos d'avancement et plans
- Questions



Revue du programme

Locaux exclusifs à chaque école

- Administration
- Salle de travail
- Orientation
- Centre de la réussite
- 9 salles de classes
- Salle multifonctionnelle
- Apprentissage en ligne

Autre locaux

- Garderie (CECCE)
- Centre Culturel Frontenac (bureaux administratifs)

Locaux partagés

- Salle d'alimentation
- Salle d'arts visuels
- Salle de musique
- Salle d'exercice
- Gymnases double et simples
- Vestiaires
- Atelier de construction
- Atelier de transport
- Atrium/caféteria/cuisine
- Bibliothèque et espaces de lecture
- 2 laboratoires de science
- Laboratoire de chimie
- Laboratoire de biologie
- Théâtre



Perspective de la nouvelle école secondaire publique Milles-Îles



Perspective de la nouvelle école secondaire catholique Marie-Rivier



Mise à jour de la construction - Bâtiment

- La construction progresse activement depuis un peu plus de 8 mois.
- Les murs de blocs porteurs, la structure d'acier ainsi que la dalle de béton de l'aile des gymnases, ateliers, locaux spécialisés et théâtre sont complétés. La toiture de cette aile devrait être complétée d'ici l'hiver.
- Le montage de la structure d'acier des bureaux administratifs du CCF ainsi que de l'aile exclusive au CEPEO a commencé.
- L'entrepreneur espère couler la dalle de béton des deux autres ailes (balance du bâtiment) d'ici l'hiver.
- Certaines étapes de construction accusent un léger retard en raison du délai de livraison de certains matériaux (cadres de portes, isolation de toiture), de la météo (chaleur, pluie) ainsi qu'à la pénurie de main-d'oeuvre (gypse en particulier). Toutefois, l'entrepreneur est confiant de rattraper le temps perdu au cours des prochains mois.



- En général, la construction progresse comme prévue et aucun délai n'est anticipé jusqu'à maintenant
- L'ouverture des écoles est prévue en 2023.

Mise à jour de la construction - Parc municipal

- Les bases granulaire des trottoirs ainsi que celles des structures de jeux sont complétées.
- Le nivellement du terrain est presque terminé.
- Tous les travaux de béton seront complétés au mois d'octobre (bordures, bases de béton, voûte mécanique, etc.)
- La construction du parc se poursuit activement. L'entrepreneur prévoit avoir complété la majorité des travaux (asphalte, bases de bétons, électricité, structure de jeux et autres équipements connexes, terrassement, arbres et arbustes) d'ici la fin novembre. La balance des travaux (alimentation d'eau, banc/table de picnic et ensemencement) sera complétée lorsque la météo le permettra au printemps.



Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Vue aérienne #1 vers le nord

Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Vue aérienne #2 vers le nord



Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Corridor C115 (gymnases et locaux spécialisés)



Gymnases



Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Salle de musique



Vestiaire des filles



Photos d'avancement de la construction - Bâtiment



Foyer C101 et bureaux du CCF



Photos d'avancement de la construction - Parc municipal




Cinq différentes aires de jeux




Pataugeoire




Plan de site

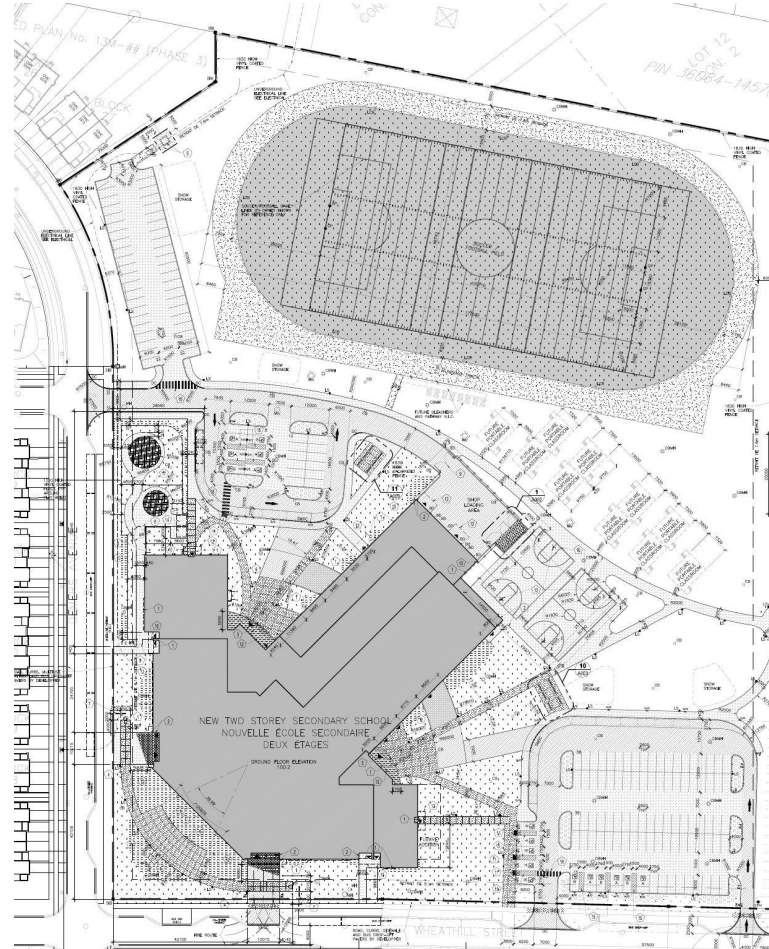

Plan du rez-de-chaussée

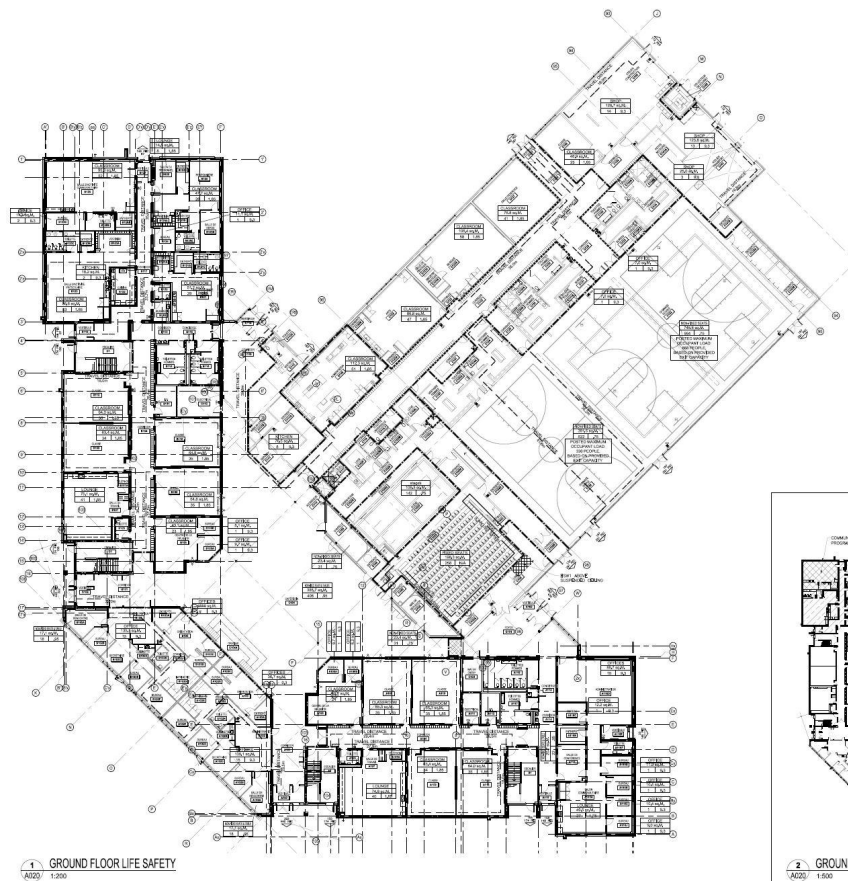

Plan de l'étage

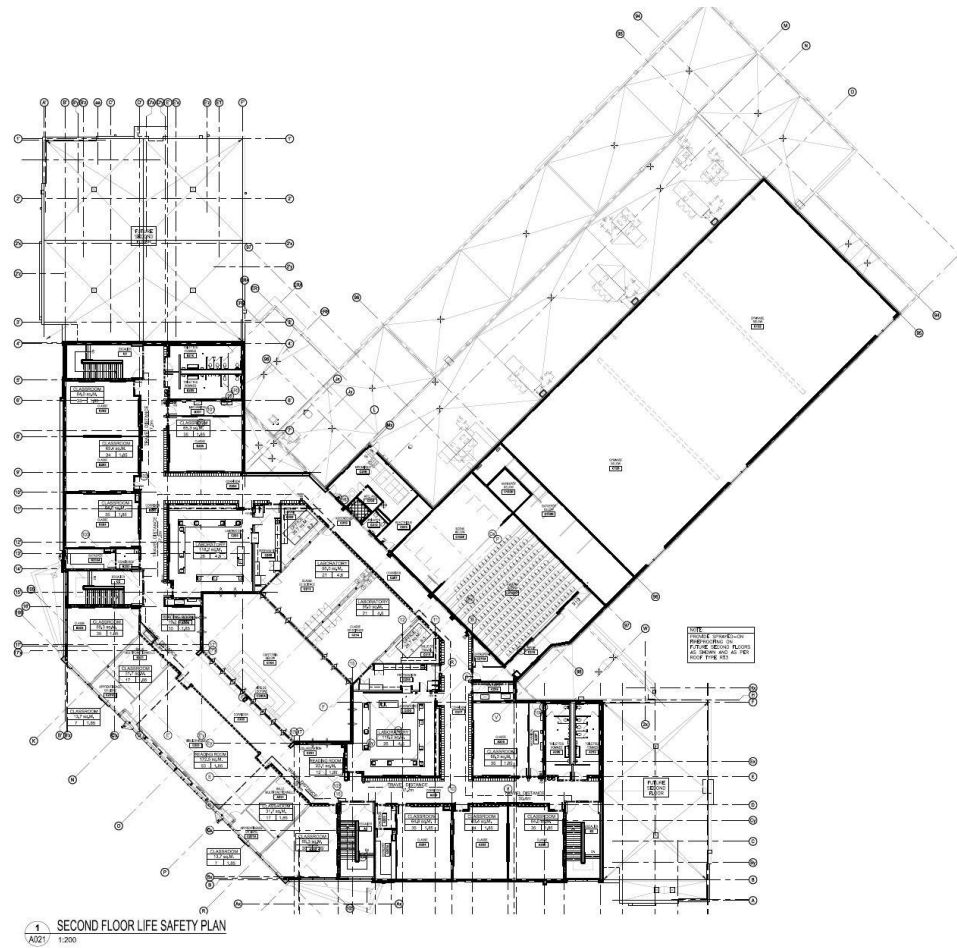

Questions

